



# AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL - GESTIÓN 2023



**El presente informe es realizado considerando el estado situacional de la gestión institucional al cierre de la gestión 2022. Aspectos que nos permiten decidir la implementación de varias estrategias de gestión institucional que se traducirán en mejores resultados.**

**El informe de Rendición Pública de Cuentas – Inicial 2023, se realiza cumpliendo el cronograma dispuesto por el Ministerio de Salud y Deportes y en cumplimiento al numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley N°341 de Participación y Control Social, Ley N°974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Resolución Ministerial N°0406 de 4 de julio de 2019 del Ministerio de Salud y el Manual Metodológico para la Rendición Pública de Cuentas emitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.**

# ¿QUÉ ES LA AISEM?

Es una institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes.



Hospital de Segundo Nivel – Coripata en el Departamento de La Paz



HOSP DE 2DO NIVEL CHALLAPATA

El D.S. N°3293 establece que la finalidad de la AISEM es ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de Cuarto Nivel de Salud, en lo referente a infraestructura en salud y equipamiento médico.

# PRINCIPIOS Y VALORES



# Estructura Organizacional




# PRESUPUESTO APROBADO PARA LA GESTIÓN 2023

(expresado en bolivianos)

TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>GASTO CORRIENTE</b>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.962.669,00
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	PROYECTOS DE INVERSIÓN TGN	635.499.282,00
	PROYECTOS DE INVERSIÓN BANCO MUNDIAL	65.839.983,00
	PROYECTOS DE INVERSIÓN BID	190.319.734,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE LA AISEM 2023</b>		<b>902.621.668,00</b>

# PRESUPUESTO APROBADO PARA LA GESTIÓN 2023 (expresado en bolivianos)

PRESUPUESTO APROBADO GESTIÓN 2023  
PARA LA GESTIÓN 2023  
(Expresado en bolivianos)

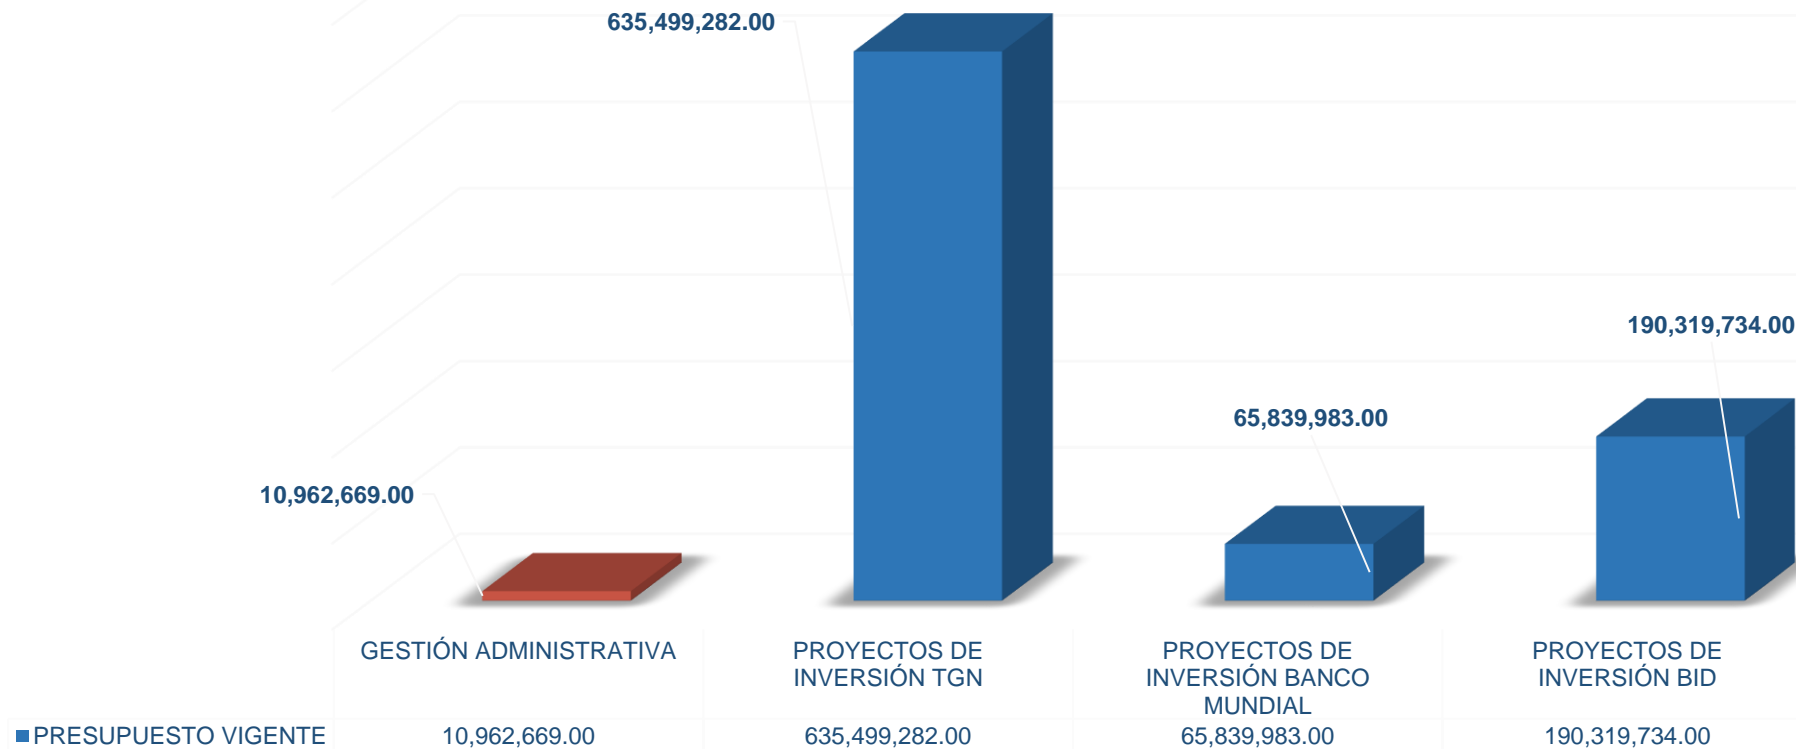

## PROYECTOS NO CAPITALIZABLES


Nº	NOMBRE PROYECTO	FUENTE FIN.	INICIO	FIN	IMPORTE TOTAL PROYECTO (Bs)	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
1	IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	TGN	02/01/2018	31/12/2024	237.117.280,00	18.771.917,00	14,53
2	IMPLEM. PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	BM	01/01/2019	31/12/2023	34.300.000,00	5.257.258,00	33,34
3	IMPLEM. PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA EN BOLIVIA	BID	01/01/2019	19/02/2024	34.986.000,00	5.035.225,00	17,67

Recursos financieros destinados a contratación de personal que administre y gestione los Programas con Financiamiento de Cooperación Internacional y/o estudios técnicos (TGN)

# RECURSOS HUMANOS DE LA AISEM, GESTIÓN 2023




**36** Personal Área Sustantiva  
(Dirección Técnica)



**66** Personal de Apoyo al Área Sustantiva  
(Todos los Demás)

# RECURSOS HUMANOS POR GENERO



Total: **102**



**49** Mujeres

**53** Varones

# FASES DE UN PROYECTO INVERSIÓN PÚBLICA

## Pre inversión

- Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un proyecto de inversión pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.

## Inversión

- Comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de inversión y se extiende hasta que se termina su implementación.
- Se llevan a cabo acciones de construcción y equipamiento.

## Puesta en marcha

- En este periodo se establece la transferencia de tecnología a los profesionales que se harán cargo del manejo del hospital.
- En esta etapa se gestiona el funcionamiento del proyecto hospitalario.

# ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA



HOSP. DE 4TO NIVEL LA PAZ

**CUARTO  
NIVEL**

Son Institutos de salud de complejidad alta con infraestructura y personal capacitado para brindar atenciones complejas a los pacientes.



HOSP. DE 3ER NIVEL VILLA TUNARI

**TERCER  
NIVEL**

Son establecimientos de salud de referencia en las ciudades principales, se atienden pacientes referidos por otros niveles (I y II nivel), que presentan patologías que requieren atención de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento.



HOSP. DE 2DO NIVEL CHALLAPATA

**SEGUNDO  
NIVEL**

Son hospitales de nivel intermedio, en donde se realiza consulta médica, hospitalización, atención de urgencias de especialidades básicas y servicios de apoyo a diagnóstico como pruebas especiales de laboratorio clínico, radiología.

# PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA AISEM**



**En el POA & Presupuesto 2023, se registraron 38 proyectos de inversión, de los cuales:**

**12 se tienen programados para concluir al cierre de la gestión 2023**

**15 corresponden a Proyectos de Continuidad**

**11 proyectos están en Fase Preliminar (Pre-inversión)**

**38** PROYECTOS DE  
INVERSIÓN programados en el  
POA & Presupuesto 2023

PROYECTOS "EN ETAPA INICIAL" = **11**

Nº	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
1	CONST. Y EQUIP. INSTITUTO ONCOLOGICO COCHABAMBA	TGN	114.088.480,00	0	0%	0%	0,30%
2	CONST. CON EQUIPAMIENTO UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL CHUQUISACA	TGN	13.346.610,00	0	0%	0%	0%
3	CONST. CON EQUIP. ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO SEGUNDO NIVEL SAN IGNACIO DE VELASCO - SANTA CRUZ.	BM	16.293.457,00	0	0%	0%	0%
4	CONST. CON EQUIP. DE ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL LA GUARDIA - SANTA CRUZ	BM	15.058.226,00	0	0%	0%	0%
5	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL SAN JULIÁN - SANTA CRUZ.	BM	16.738.194,00	0	0%	0%	0%

PROYECTOS "EN ETAPA INICIAL" = **11**

Nº	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
6	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL CARNAVI - LA PAZ	BM	6.568.027,00	0	0%	0%	0%
7	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EL TORNO- SANTA CRUZ.	BID	6.383.916,00	0	0%	0%	0%
8	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL IXIAMAS - LA PAZ.	BID	1.919.912,00	0	0%	0%	0%
9	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL PALOS BLANCOS - LA PAZ.	BID	1.921.785,00	0	0%	0%	0%
10	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL PUERTO SUAREZ - SANTA CRUZ	BID	306.299,00	0	0%	0%	0%
11	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL SAN BORJA - BENI.	BID	1.931.659,00	0	0%	0%	0%

## PROYECTOS EN ETAPA DE "EJECUCIÓN" = 24

Nº	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
1	CONST. Y EQUIP. INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO EN LA PAZ	TGN	70.007.437,00	9.200.639,33	13,14%	45,73%	80,89%
2	CONST. HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE TRINIDAD	TGN	190.202.620,00	0	0%	39,50%	51,99%
3	EQUIP. HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL A NIVEL NACIONAL	TGN	100.000.000,00	2.035.415,55	2,04%	60,20%	60,49%
4	CONST. CON EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO CHUQUISACA	TGN	18.698.806,00	707.566,91	3,78%	79,53%	94,61%
5	IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	TGN	18.771.917,00	607.884,88	3,24%	14,53%	14,53%

## PROYECTOS EN ETAPA DE "EJECUCIÓN" = 24

N°	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
6	CONST. CON SU EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL CORIPATA - LA PAZ	TGN	26.496.266,00	0	0%	18,07%	38,18%
7	CONST. CON EQUIPAMIENTO UNA UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL COCHABAMBA	TGN	20.000.000,00	0	0%	0,23%	18,76%
8	CONST. CON EQUIPAMIENTO UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL POTOSI	TGN	13.087.054,00	0	0%	0,25%	19,98%
9	FORTAL. HOSPITALES CON EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD A NIVEL NACIONAL	TGN	9.293.609,00	5.604.984,00	60,31%	90,41%	90,41%
10	EQUIP. MEDICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	TGN	788.118,00	0	0%	98,54%	98,54%

## PROYECTOS EN ETAPA DE "EJECUCIÓN" = 24

Nº	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
11	IMPLEM. PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	BM	5.257.258,00	403.186,53	7,67%	33,34%	33,34%
12	CONST. EQUIP Y PUEST. EN MARCHA DE LA UNID. DE EMERGENCIAS PARA EL HOSP. DE CLÍNICAS UNIV. DE LA PAZ	BM	1.033.434,00	0	0%	8%	7,82%
13	FORTAL. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MEJORA EN INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1ER NIVEL LA PAZ	BM	4.891.387,00	0	0%	0%	0%
14	CONST. CON EQUIP. HOSPITAL 2DO NIVEL VILLAZON	BID	17.877.332,00	0	0%	1,37%	15,74%
15	CONST. CON EQUIP. HOSPITAL 2DO NIVEL TUPIZA	BID	17.387.704,00	0	0%	1,37%	15,77%

## PROYECTOS EN ETAPA DE "EJECUCIÓN" = 24

Nº	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
16	CONST. CON EL EQUIP. HOSPITAL DE 2DO NIVEL CAMIRI-STA.CRUZ	BID	15.525.298,00	0	0%	1,23%	15,63%
17	CONST. CON EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO HOSPITAL. DE 3ER NIVEL PEDIATRICO, EL ALTO - LA PAZ.	BID	7.404.080,00	0	0%	0%	0%
18	CONST. CON EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL MONTEAGUDO - CHUQUISACA	BID	14.896.976,00	0	0%	1,34%	15,74%
19	IMPLEM. PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA EN BOLIVIA	BID	5.035.225,00	345.111,50	6,85%	17,67%	17,67%
20	EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL HOSPITAL SAN SALVADOR OCURI - POTOSI	BID	7.156.229,00	348.304,43	4,87%	51%	54,19%

## PROYECTOS EN ETAPA DE "EJECUCIÓN" = 24

Nº	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
21	EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL HOSPITAL MADRE OBRERA LLALLAGUA - POTOSI	BID	13.152.923,00	1.169.500,07	8,89%	51%	60,41%
22	EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL HOSPITAL EL ALTO NORTE LA PAZ	BID	2.108.000,00	508.730,51	24,13%	65%	66,01%
23	EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL HOSPITAL EL ALTO SUR LA PAZ	BID	1.169.828,00	96.999,99	8,29%	95%	91,24%
24	EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI	BID	76.142.568,00	4.297.259,79	5,64%	25,80%	27,80%

## PROYECTOS EN ETAPA DE "PUESTA EN MARCHA " = 3

Nº	PROYECTO	FUENTE FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	MONTO EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO 2023	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% AVANCE FÍSICO ACUMULADO A FEB 2023	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A FEB 2023
1	CONST. HOSP. TERCER NIVEL VILLA TUNARI	TGN	1.615.757,00	145.999,80	9,04%	99,91%	97,06%
2	CONST. HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO	TGN	36.273.491,00	0	0%	90,78%	89,27%
3	CONST. CON EQUIP Y PUESTA EN MARCHA HOSP.2DO NIVEL CHALLAPATA-ORURO	TGN	2.829.117,00	0	0%	99,38%	97,04%

# HOSPITALES DE CUARTO NIVEL



# HOSPITAL DE CUARTO NIVEL

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO DE CUARTO NIVEL LA PAZ – FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 736.835.000,00  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 240.000 hab.

**N° CAMAS:** 64

**N° SERVICIOS:** 30

**ÁREA CONSTRUIDA:** 27.600 M2

**FASE DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO):**

**INICIO :** 30/09/2019      **FIN:** 30/06/2023

**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO:** 30/06/2023      **FIN:**  
30/06/2024

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
**AL 28/02/2023 = 45,73%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
**AL 28/02/2023 = 80,89%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**AL 2023= 90%**



# **HOSPITALES DE TERCER NIVEL**



# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

1

## CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI – FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 535.078.000,00  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 192,140.00 hab.

**N° CAMAS:** 200

**N° SERVICIOS:** 37

**ÁREA CONSTRUIDA:** 23,264.10 [m<sup>2</sup>]

**FASE DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN Y  
EQUIPAMIENTO):**

**INICIO :** 21/11/2017      **FIN:** 09/12/2021

**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO:** 10/12/2021      **FIN:** 10/12/2023

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 28/02/2023 = 99.91%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:  
AL 28/02/2023 = 97.06%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2023 = 100%**



# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

2

## CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO – FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 497,044,112.16  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 43,807.00 hab.

**N° CAMAS:** 203

**N° SERVICIOS:** 45

**ÁREA CONSTRUIDA:** 26,240.90 [m2]

**FASE DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN Y  
EQUIPAMIENTO):**

**INICIO :** 28/11/2017      **FIN:** 01/01/2022

**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO:** 02/01/2022      **FIN:** 24/03/2023

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 28/02/2023 = 90.78%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA: AL 28/02/2023 =  
89.27%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2023 = 100%**



# HOSPITALES DE TERCER NIVEL

## EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR LA PAZ – FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 44,877,219.00

**POBLACIÓN BENEFICIADA :** 2.926.996 hab.

**INICIO:** 18/09/2019 **FIN:** 31/12/2023

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
AL 28/02/2023 = 95%

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
AL 28/02/2023 = 91,24%

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA** AL 2023 = 100%



Mediante el Subcomponente 2.1 brechas de equipamiento se ha fortalecido con equipamiento médico distintas áreas del hospital como: Quirófano, Medicina Interna, enfermería y emergencias.

## EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE LA PAZ – FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 9,991,139.00

**POBLACIÓN BENEFICIADA :** 2.926.996 hab.

**INICIO:** 18/09/2019 **FIN:** 31/12/2023

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
AL 28/02/2023 = 65%

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
AL 28/02/2023 = 66,01%

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA** AL 2023 = 100%



Mediante el Subcomponente 2.1 brechas de equipamiento se ha fortalecido con equipamiento médico distintas áreas del hospital como: Quirófano, Medicina Interna, enfermería y emergencias

# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

5

## EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL POTOSÍ – FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO: Bs.  
213,787,784.00**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 907,686 hab.**

**INICIO : 19/09/2019  
FIN: 31/12/2023**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA  
AL 28/02/2023 = 25,8%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:  
AL 28/02/2023 = 27,28%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA  
AL 2023 = 100%**



Mediante el Subcomponente 2.1 brechas de equipamiento se ha fortalecido con equipamiento médico distintas áreas del hospital como: Imagenología, Ecografía, Quirófano, Emergencias, Medicina Interna, Enfermería y todas las áreas dentro del nosocomio, puesto que este hospital no contaba con equipamiento.

# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

## EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

**COSTO DE PROYECTO: Bs 69,600,000.00**

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA  
NACIONAL: 163.727 Habitantes**

**INICIO: 10-05-2021 FIN: 31/12/2023**

**EJECUCIÓN FÍSICA (AL 28/02/23) = 98.54%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA  
(AL 28/02/23) = 98.54%**

**META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA  
PROYECTADA (AL 31/12/23) = 100 %**



# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

2

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL CHUQUISACA – FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 494.385.500,00  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 155.632 hab.

**N° CAMAS:** 204

**N° SERVICIOS:** 28

**ÁREA CONSTRUIDA:** 25.285 M2

**FASE DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN Y  
EQUIPAMIENTO):**

**INICIO :** 29/06/2018      **FIN:** 19/01/2023

**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO:** 08/02/2023      **FIN:**  
02/04/2024

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**


**AL 28/02/2023 = 79,53**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**

**AL 28/02/2023 = 94,61%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

**AL 2023= 98%**

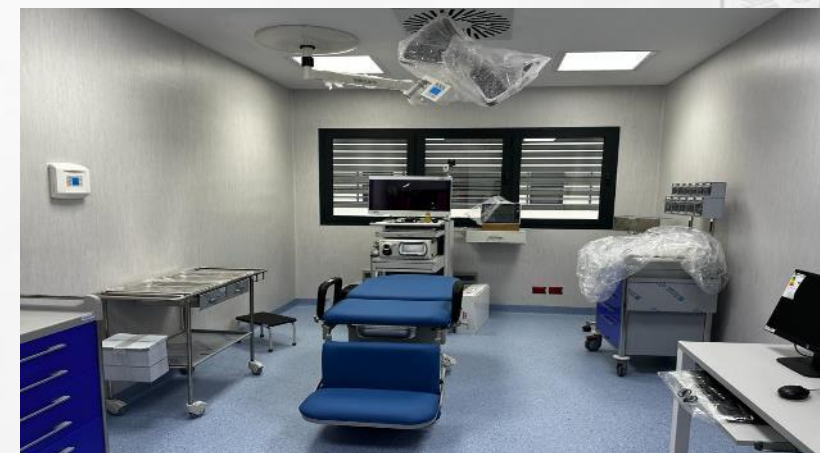

# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

3

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL TRINIDAD – FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO: Bs. 514.500.000,00**  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA: Referencia**  
Departamental

**N° CAMAS: 205**

**N° SERVICIOS: 41**

**ÁREA A CONSTRUIDA: 25.000 M2**

**FASE DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN Y**  
EQUIPAMIENTO):

**INICIO : 09/09/2020      FIN: 03/03/2023**


**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO: 04/03/2023      FIN:**  
04/03/2024

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
AL 28/02/2023 = 39,5%

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
AL 28/02/2023 = 51,99%

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**  
AL 2023= 59,11%

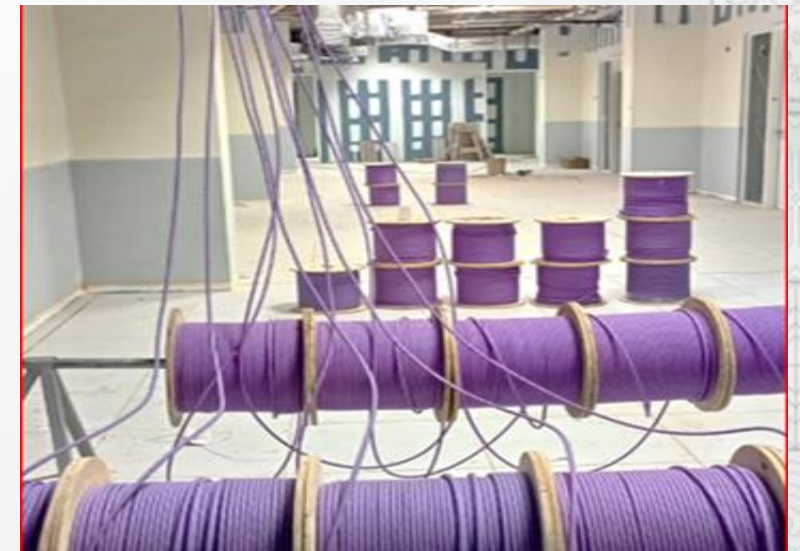

# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

4

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL PEDIÁTRICO EL ALTO – LA PAZ FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO: Bs. 473.340.000,00**  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 922.598 hab.**

**N° CAMAS: 180**

**N° SERVICIOS: 19 (ITCP)**

**ÁREA A CONSTRUIR: 24.413 M2**

**FASE DE PREINVERSIÓN (DISEÑO):**

**INICIO : 10/11/2022**

**FIN: 06/09/2023**

**FASE DE INVERSIÓN:**

**INICIO ESTIMADO: 06/01/2024**

**FIN:**

**20/02/2027**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**


**AL 28/02/2023 = 0%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**

**AL 28/02/2023 = 0%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

**AL 2023= 1,56%**

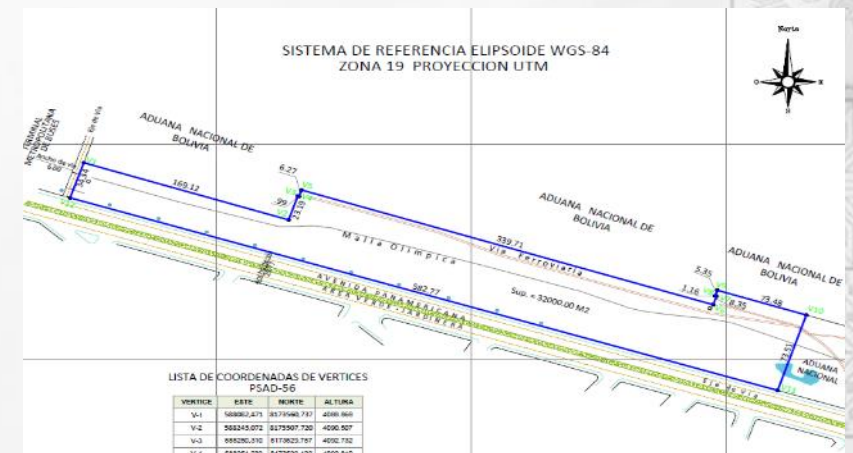

# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

5

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN COCHABAMBA - FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 97.427.086,00  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 1.971.523 hab.

**N° CAMAS:** 8

**N° SERVICIOS:** 15

**ÁREA A CONSTRUIR:** 4.699,16 M2

**FASE DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN  
(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO):**

**INICIO :** 10/09/2022      **FIN:** 09/01/2024

**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO:** 10/01/2024      **FIN:**  
09/04/2024

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA  
AL 28/02/2023 = 0,23**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:  
AL 28/02/2023 = 18.76%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA  
AL 2023= 38%**



# HOSPITAL DE TERCER NIVEL

6

CONST. CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN EL DEP. DE POTOSÍ – FUENTE TGN Y GAD

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 97.427.086,00  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 823.517 hab.

**N° CAMAS:** 8

**N° SERVICIOS:** 15

**ÁREA A CONSTRUIR:** 2143.80 M2

**FASE DE PREINVERSIÓN (DISEÑO):**

**INICIO :** 10/11/2022      **FIN:** 9/03/2023

**FASE DE INVERSIÓN Y PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO:** 10/03/2023      **FIN:**  
1/06/2024

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**

**AL 28/02/2023 = 0,25%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**

**AL 28/02/2023 = 19,98%%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

**AL 2023= 7,37%**



## CONST. EQUIP. UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL DE CLÍNICAS UNIVERSITARIO – LA PAZ – FUENTE BANCO MUNDIAL

**FASE I: Construcción Bloque de Contingencias (espacio temporal para el servicio de emergencias donde se asistirá a pacientes hasta que se construya la nueva edificación) representa el 8% del proyecto.**

**COSTO DE PROYECTO: Bs. 63.300.000,00**  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.663.099 hab.**

**N° CAMAS: 28 Cubículos para atención de emergencias y 10 cubículos de hospitalización**  
**N° SERVICIOS: 12**

**ÁREA A CONSTRUIR: 3.804,30 [m<sup>2</sup>]**

**ETAPA I: Construcción Edificio de Contingencias**  
**INICIO: 24/11/2021      FIN: 10/06/2022**

**ETAPA II: Diseño y Construcción Nueva Unidad de Emergencias**  
**INICIO: 15/04/2023      FIN: 30/12/2026**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
**AL 28/02/2023 = 8%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
**AL 28/02/2023 = 7,82%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2023= 100%**



# HOSPITALES DE TERCER NIVEL

## FORTAL. HOSPITALES CON EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD A NIVEL NACIONAL

**COSTO DE PROYECTO: Bs**  
**166,911,000.00**

**INICIO: 06/02/2019 FIN: 31/12/2023**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
**AL 28/02/2023 = 90,41%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**AL 2023 = 100%**

El proyecto consiste en dotar de equipamiento médico a 14 Hospitales de tercer nivel y se espera concluir 5 Hospitales (Fase de Adquisición) en la presente gestión:

1. Instituto Nacional Del Tórax – La Paz, avance del **86,36%**
2. Hospital Daniel Bracamonte - Potosí, avance del **41,61%**
3. Hospital De Niños Dr. Mario Ortiz Suarez - Santa Cruz, avance **47,22%**
4. Hospital De La Mujer Percy Boland- Santa Cruz, avance del **65,66%**
5. Hospital Del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría - La Paz, avance del **6,86%**



# HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL



# HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

8

## CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CHALLAPATA – FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 100,600,821.70  
Construcción y Supervisión

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 25,000.00 hab.

**N° CAMAS:** 70

**N° SERVICIOS:** 23

**ÁREA CONSTRUIDA:** 6,853.78 [m<sup>2</sup>]

**FASE DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN Y  
EQUIPAMIENTO):**

**INICIO :** 22/12/2017      **FIN:** 14/05/2021

**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**

**INICIO ESTIMADO:** 15/05/2021      **FIN:**  
17/02/2023

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**

**AL 28/02/2023 = 99.38%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**

**AL 28/02/2023 = 97,04%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

**AL 2023= 100%**



# HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

8

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CAMIRI, SANTA CRUZ - FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO:** Bs. 125.512.363,00  
Diseño Construcción y Equipamiento

**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 137.047 habitantes.

**N° CAMAS:** 106

**N° CONSULTORIOS:** 11

**ÁREA A CONSTRUIR:** 8,920,05 [m<sup>2</sup>]

**PLAZO DE PROYECTO  
(DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO):**  
INICIO : 10/03/2022      FIN: 22/04/2025

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA  
AL 28/02/2023 = 1,23 %**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA.  
AL 28/02/2023 = 15,63 %**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2023  
13,28 %**



# HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

9

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MONTEAGUDO, CHUQUISACA - FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO: Bs 115.387.682,00**  
Diseño Construcción y Equipamiento

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 55.473 habitantes.**

**N° CAMAS: 70**

**N° CONSULTORIOS: 12**

**ÁREA A CONSTRUIR: 7.748,66 [m2]**

**PLAZO DE PROYECTO**  
**(DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO):**  
**INICIO : 10/03/2022      FIN: 22/04/2025**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
**AL 28/02/2023 = 1,34 %**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
**AL 28/02/2023 = 15,74%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2023**  
**13,88 %**



# HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

10

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL TUPIZA- FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO: Bs 121.100.217,00**  
Diseño Construcción y Equipamiento

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 69.125 habitantes.**

**N° CAMAS: 74**

**N° SERVICIOS: 27**

**ÁREA A CONSTRUIR: 8.278,39 [m2]**

**FASE DE DISEÑO. CONSTRUCCIÓN Y  
EQUIPAMIENTO):**

**INICIO : 10/03/2022      FIN: 22/04/2025**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA  
AL 28/02/2023 = 1,37 %**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:  
AL 28/02/2023 = 15,77%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2023  
14,36 %**



# HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

11

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL VILLAZON- FUENTE BID

**COSTO DE PROYECTO: Bs 116.669.328,00**  
Diseño Construcción y Equipamiento

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 48.943 habitantes.**

**N° CAMAS: 66**  
**N° CONSULTORIOS: 20**  
**ÁREA A CONSTRUIR: 7.798,88 [m2]**

**FASE DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO:**  
**INICIO : 10/03/2022      FIN: 22/04/2025**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
**AL 28/02/2023 = 1,37 %**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
**AL 28/02/2023 = 15,74%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**AL 2023 15,32 %**



# HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL CORIPATA, LA PAZ – FUENTE TGN

**COSTO DE PROYECTO: Bs 105.000.000,00**

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 17.586 HAB.**

**N° CAMAS DE DÍA: 65**  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA: 6.045,81 m<sup>2</sup>**  
**N° SERVICIOS: 11**

**FASE DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO):**  
**INICIO : 12/01/23      FIN: 04/08/24**

**FASE DE PUESTA EN MARCHA:**  
**INICIO ESTIMADO: 06/05/24      FIN: 03/09/24**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA:**  
**AL 28/02/2023 = 18,07%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
**AL 28/02/2023 = 38,18%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**  
**AL 2023 = 63,42%**

**En fecha 12 de enero de 2023 se emitió la orden proceder.**



# HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL

9-10

## EQUIP. DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA - BID

**COSTO DE PROYECTO: Bs 50.618.911,00**

**POBLACIÓN BENEFICIADA LLALLAGUA: 41.104  
habitantes**

**INICIO: 03/05/2019**

**FIN: 31/12/2023**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUM. AL 28/02/2023 = 51 %  
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. AL 28/02/2023 =  
60,41%**



## EQUIP. DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL SAN SALVADOR OCURI DEPTO.POTOSI - BID

**COSTO DE PROYECTO: Bs 22.849.275,00**

**POBLACIÓN BENEFICIADA OCURI: 16.448  
habitantes**

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUM. AL 28/02/2022 = 51%  
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM. AL 28/02/2022 = 54,19 %**

**INICIO: 03/05/2019**

**FIN: 31/12/2023**



# HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL

## EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL A NIVEL NACIONAL

**COSTO DE PROYECTO: Bs 410.200.000**

**INICIO: 06/02/2019 FIN: 31/12/2023**

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:  
AL 28/02/2023 = 60,49%**

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL  
2023 = 100%**



**El proyecto contempla el fortalecimiento de equipamiento de 10 hospitales de Segundo Nivel y 2 de Tercer nivel y se espera concluir 5 Hospitales (Fase de Adquisición) en la presente gestión:**

1. Hospital de Segundo Nivel Achacachi, avance del 64,7%
2. Hospital de Segundo Nivel Capinota, avance del 64,27%
3. Hospital de Segundo Nivel Entre Ríos, avance del 89,19%
4. Hospital de Segundo Nivel Punata, avance del 77,22%
5. Hospital de Segundo Nivel San Buenaventura, avance del 68,87%



# **FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMER NIVEL**



## FORTALECIMIENTO REDES DE SALUD DE LA PAZ (READECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO)

**COSTO DE PROYECTO: Bs 9.265.943,00**  
Readecuación de infraestructura y Equipamiento

**POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.663.099 Habitantes**

**Servicios Beneficiados:**


- Laboratorio
- Imagenología
- Sala de Partos

**FASE DE INVERSIÓN (READECUACIÓN Y  
EQUIPAMIENTO):**  
INICIO : 01/12/2022      FIN: 31/07/2023

**EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA**  
AL 28/02/2023 = 0%

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA:**  
AL 28/02/2023=0%

**META DE EJECUCIÓN FINANCIERA**  
AL 2023= 100%

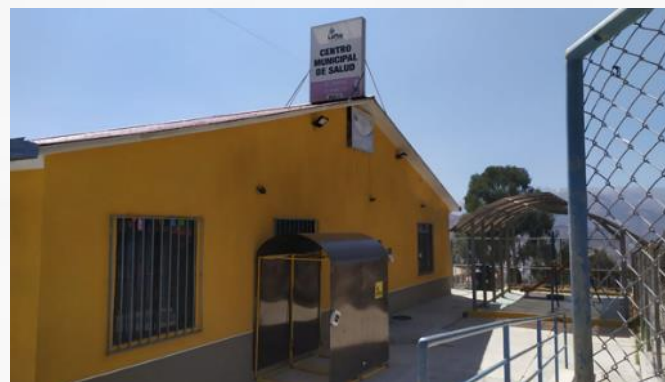

Consiste en readecuar y/o equipar a centros de salud, en la presente gestión se prevé concluir 6 centros de salud:

1. C.S ALTO OBRAJES
2. C.S MALLASA
3. C.S. ASISTENCIA PUBLICA
4. C.S. EL ROSAL
5. C.S. TEJAR
6. C.S. TEMBLADERANI



**GRACIAS**

