



**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO**

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL GESTIÓN 2022

NORMATIVA APLICABLE

- **Constitución Política del Estado.**
- **Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.**
- **Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.**
- **Ley N° 341 de Participación Social.**
- **Ley N° 974 de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.**
- **Decreto Supremo N° 29894 Organización del Órgano Ejecutivo.**
- **Decreto Supremo N° 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.**
- **Decreto Supremo N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, sus modificaciones y otras normas conexas.**
- **Decreto Supremo N° 3293- Creación de la AISEM.**
- **Decreto Supremo N° 4224- Amplía las atribuciones de la AISEM.**



**ACCESO A LA
INFORMACIÓN**

**ÉTICA
PÚBLICA**

**CONTROL
SOCIAL**

**RENDICIÓN
PÚBLICA DE
CUENTAS**



MAE - AISEM

- MÉDICO CIRUJANO DE PROFESIÓN.

Egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM del hermano país de Cuba.

- TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 2010.

- Miembro de la Brigada Henry Reeve Misión Internacionalista (Durante el terremoto en Haití 2010).

- MÉDICO COMUNITARIO MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY – ORURO.

- Presidente de la Asociación de Profesionales Graduados en Cuba Departamental de Oruro.

- VICEPRESIDENTE NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES GRADUADOS EN CUBA – APGRC.

- Director del Servicio Departamental de Salud Oruro SEDES.

- JEFE MÉDICO CENTRO DE SALUD LOS ÁNGELES DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.



**Dr. Javier Christian Fulguera Condori
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - AISEM**

¿QUÉ ES AISEM?

D. S. N° 3293 24/08/2017

Institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes.

D. S. N° 4224 24/04/2020

Se amplía las atribuciones de la AISEM, para realizar actividades, mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, contra el brote del Coronavirus (COVID-19).

VISIÓN

Es la entidad **EJECUTORA** de **PROYECTOS Y PROGRAMAS** integrales y multidisciplinarios de salud referente a nivel nacional, reconocida por su capacidad técnica, ética e idoneidad, que contribuye al logro de los objetivos estratégicos sectoriales del Ministerio de Salud, mediante la **CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DE SEGUNDO, TERCER NIVEL E INSTITUTOS DE CUARTO NIVEL DE SALUD.**

MISIÓN

EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS integrales, **multidisciplinarios** de establecimientos de salud hospitalarios **DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL E INSTITUTOS DE CUARTO NIVEL DE SALUD**, para dotar de infraestructura, equipamiento, tecnología, conocimiento y/o capacidad de gestión al Sistema Único de Salud, para permitir el acceso de toda la población a servicios de salud con calidad y calidez, para contribuir al logro del “vivir bien”.

ARTICULACIÓN DE AISEM AL PDES

PDES Eje 6 - Meta 6.6

RESULTADO 6.6.1.
SE HA CONTRIBUIDO CON
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO LOS
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE 1ER., 2DO., Y
3ER. NIVEL E INSTITUTOS
DE 4TO. NIVEL DE SALUD.

PEI 2021-2025

Implementar una gestión de proyectos de **INVERSIÓN EN SALUD EFECTIVA**, que permita la exitosa implementación de al menos 56 proyectos de establecimientos de salud y hospitalarios para garantizar el acceso a los servicios de salud de la población a nivel nacional hasta el año 2025.

Contar con una **GESTIÓN PÚBLICA**, eficaz, eficiente y **TRANSPARENTE**, que permita la ejecución de al menos un 97% de los recursos de gasto corriente asignados para el cumplimiento de las atribuciones de la AISEM a nivel nacional hasta el 2025.

POA 2022

Ejecutar al menos nueve (9) proyectos de inversión, para la implementación del Plan de Hospitales que aporten al **Sistema Único de Salud** y (2) proyectos de unidades de radioterapia en los Departamentos de Cochabamba y Potosí.

Ejecutar proyectos de inversión hospitalaria y **equipamiento médico** en establecimientos de salud en cumplimiento al Proyecto Redes de Servicios de Salud.

Promover la implementación del Plan de Hospitales a través de siete (7) estudios técnicos de pre inversión de establecimientos de salud hospitalarios y dotar de equipamiento médico a cinco (5) establecimientos de salud.

Dotar de equipamiento médico a establecimientos de salud.

Garantizar la gestión administrativa, financiera, legal, planificación, comunicación y control para una **gestión eficiente y transparente** de los recursos.

AISEM Y SUS AUTORIDADES




RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 013/2018

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - 2022


CATEGORÍA	CLASE	NIVEL SALARIAL	DENOMINACION DEL PUESTO	N° DE ITEMS
SUPERIOR	2°	1	Director General Ejecutivo	1
EJECUTIVO	3°	2	Director de Área	3
	4°	3	Jefe de Unidad	2
OPERATIVO	5°	4	Especialista	8
	5°	5	Profesional I	8
	5°	6	Profesional II	4
	6°	7	Profesional III/Técnico I	5
	6°	8	Profesional IV/Técnico II	2
	6°	9	Técnico III	5
	7°	10	Administrativo I	1
	7°	11	Administrativo II	1
TOTAL NUMERO DE ITEMS				40

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 323/2019

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PERSONAL DE AISEM

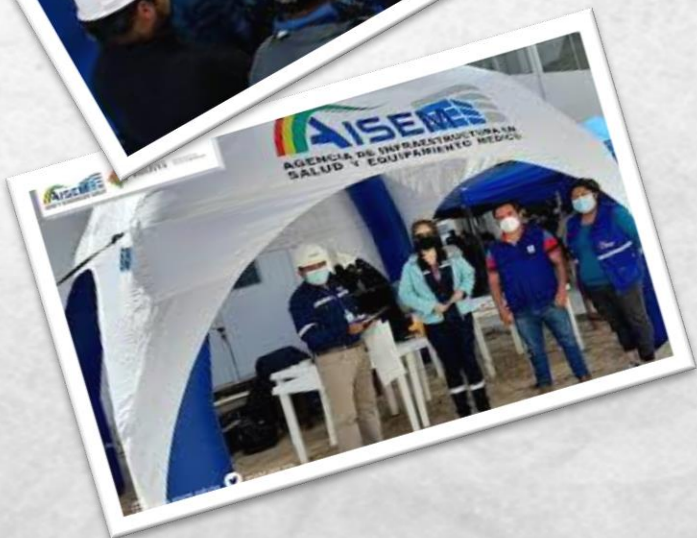

VARONES
47%



MUJERES
53%

PERSONAL	ITEM	EVENTUAL - CIL	TOTAL
MUJERES	12	49	61
VARONES	16	38	54
TOTAL	28	87	115

Fuente : Planillas AISEM

PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS HOSPITALARIOS

**ESPECIALISTAS EN
INFRAESTRUCTURA**




**TEC.
ELECTROMECA'NICOS**

**INGENIEROS/AS
AMBIENTALES**



**ABOGADOS/AS, AUDITORES/AS,
CONTADORES/AS, COMUNICADORES/AS,
ADMINISTRADORES/AS.**



**MÉDICO
SALUBRISTA**

BIOMÉDICO



**ING. SISTEMAS -
INFORMÁTICOS**


PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL



Buscamos fortalecer competencias laborales, conocimientos y habilidades de las y los servidores públicos de AISEM, propiciando su desarrollo integral y el mejoramiento continuo de la entidad.

REFORZAR CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL

N°	PERSONAL SUPERIOR EJECUTIVO Y/O ESTRATÉGICO
1	Dirección de Proyectos
2	Procesos Disciplinarios Administrativos



N°	TÉCNICO OPERATIVO
1	Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción
2	Gestión de Proyectos
3	Equipamiento Médico
4	Sistemas de Administración y Control
5	Infraestructura Hospitalaria
6	Normativa Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial



PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

¿QUÉ ES EL PAC?

Programa Anual de Contrataciones

ENTIDAD CONVOCANTE

Código de la entidad: 0102 11 00 Denominación de la Entidad: AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO Fax: 213307 Teléfono: 212407

CONTRATACIONES MENORES

#	Tipo de Contratación	Código interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Presupuesto referencial	Estado del registro		
1	Servicios Generales	103112	SERVICIO DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIO ESCRITO PARA LA AISEM - CONTRATO DE PRESTAMO A1218LBO GESTIÓN 2022	Contratación Menor	Banco Interamericano de Desarrollo	Febrero	17000	Creación	Modificación	Publicación
2	Servicios Generales	103131	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Febrero	49000	Modificación	Publicación	Publicación
3	Servicios Generales	103210	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Febrero	20000	Modificación	Publicación	Publicación
4	Bienes	103216	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CREDITALES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Febrero	22000	Modificación	Publicación	Publicación
5	Servicios Generales	103312	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y ESCANERES	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Marzo	42000	Modificación	Publicación	Publicación
6	Bienes	103343	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	29000	Modificación	Publicación	Publicación
7	Bienes	103116	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	48434	Modificación	Publicación	Publicación
8	Bienes	104012	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	21160	Modificación	Publicación	Publicación
9	Bienes	103342	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA DATACENTER DE LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	32000	Modificación	Publicación	Publicación
10	Servicios Generales	103210	SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL PARA LA AISEM 2022	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	32200	Modificación	Publicación	Publicación



ES UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN.



ES UN DOCUMENTO FORMAL DE CARÁCTER PÚBLICO REGISTRADO EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Programa Anual de Contrataciones

ENTIDAD CONVOCANTE		Denominación de la Entidad		Fax	Teléfono					
Código de la entidad		ASIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO		7420007	7420007					
CONTRATACIONES MENORES										
#	Tipo de Contratación	Código Interno FAC	Objeto de la contratación	Forma de contratación	Principal organismo convocador	Mes estimado de publicación	Presupuesto estimado	Fecha del registro		
1	Servicios Generales	1031712	SERVICIO DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIO ESCRITO PARA LA AISEM - CONTRATO DE PRESTAMO ALIENENACION 2022	Contratación Menor	Banco Interamericano de Desarrollo	Febrero	17000	Creación	Modificación	Publicación
2	Servicios Generales	1031713	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Febrero	49000	Creación	Modificación	Publicación
3	Servicios Generales	1031714	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Febrero	20000	Creación	Modificación	Publicación
4	Bienes	1031715	ADQUISICION DE IMPRESORA DE CREDENCIAL Y SUMINISTROS PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Febrero	22000	Creación	Modificación	Publicación
5	Servicios Generales	1031716	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y ESCANERES	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Marzo	42000	Creación	Modificación	Publicación
6	Bienes	1031717	ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	32000	Creación	Modificación	Publicación
7	Bienes	1031718	ADQUISICION DE TONERS PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	45000	Creación	Modificación	Publicación
8	Bienes	1031719	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	21000	Creación	Modificación	Publicación
9	Bienes	1031720	SISTEMA DE REFRIGERACION PARA DATACENTER DE LA AISEM	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	33000	Creación	Modificación	Publicación
10	Servicios Generales	1031721	SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL PARA LA AISEM 2022	Contratación Menor	Tesoro General de la Nación	Abril	22000	Creación	Modificación	Publicación



Monitorear y hacer seguimiento a las contrataciones.



Transparentar las contrataciones.



Dar mayor participación de posibles proponentes.




Programar las actividades para que el proceso de contratación se realice con éxito.

PAC DE AISEM


<https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/pac/pac.php>

N°	MODALIDAD	CANTIDAD DE PROCESOS	IMPORTE TOTAL Bs.
1	CONTRATACIÓN MENOR	10	381,694.00
2	APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)	5	1,141,704.50
3	LICITACIÓN PÚBLICA	8	91,710,000.00
4	OTRAS MODALIDADES	32	322,009,400.60
TOTAL Bs		55	415,242,799.10

CANTIDAD DE PROCESOS

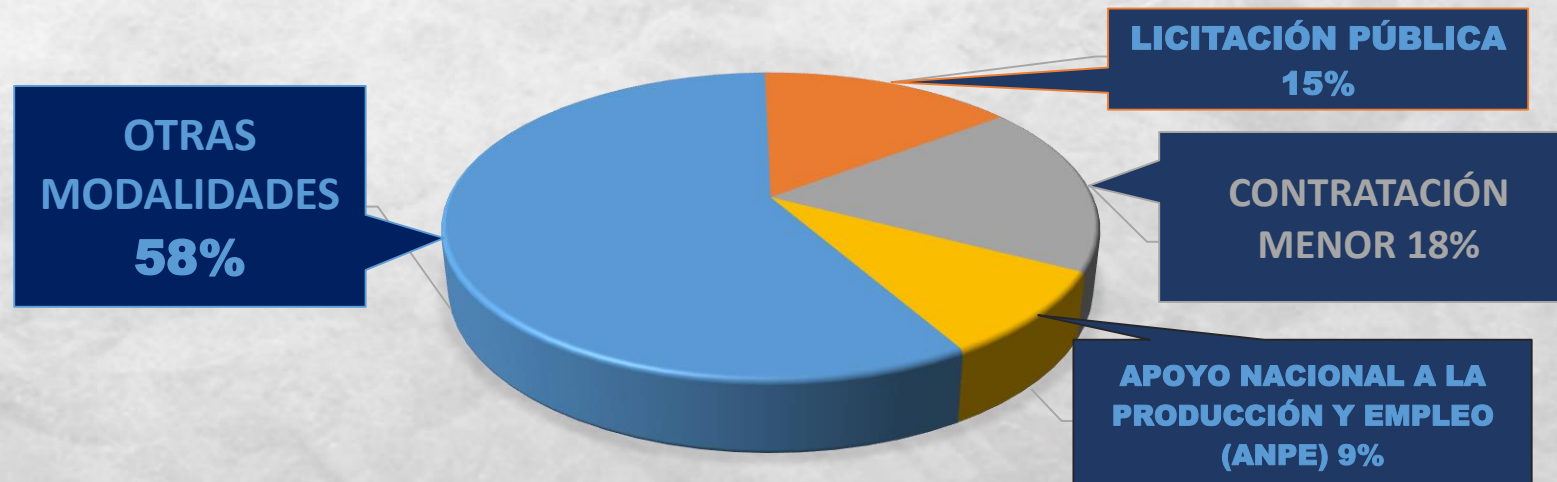

PRESUPUESTO VIGENTE

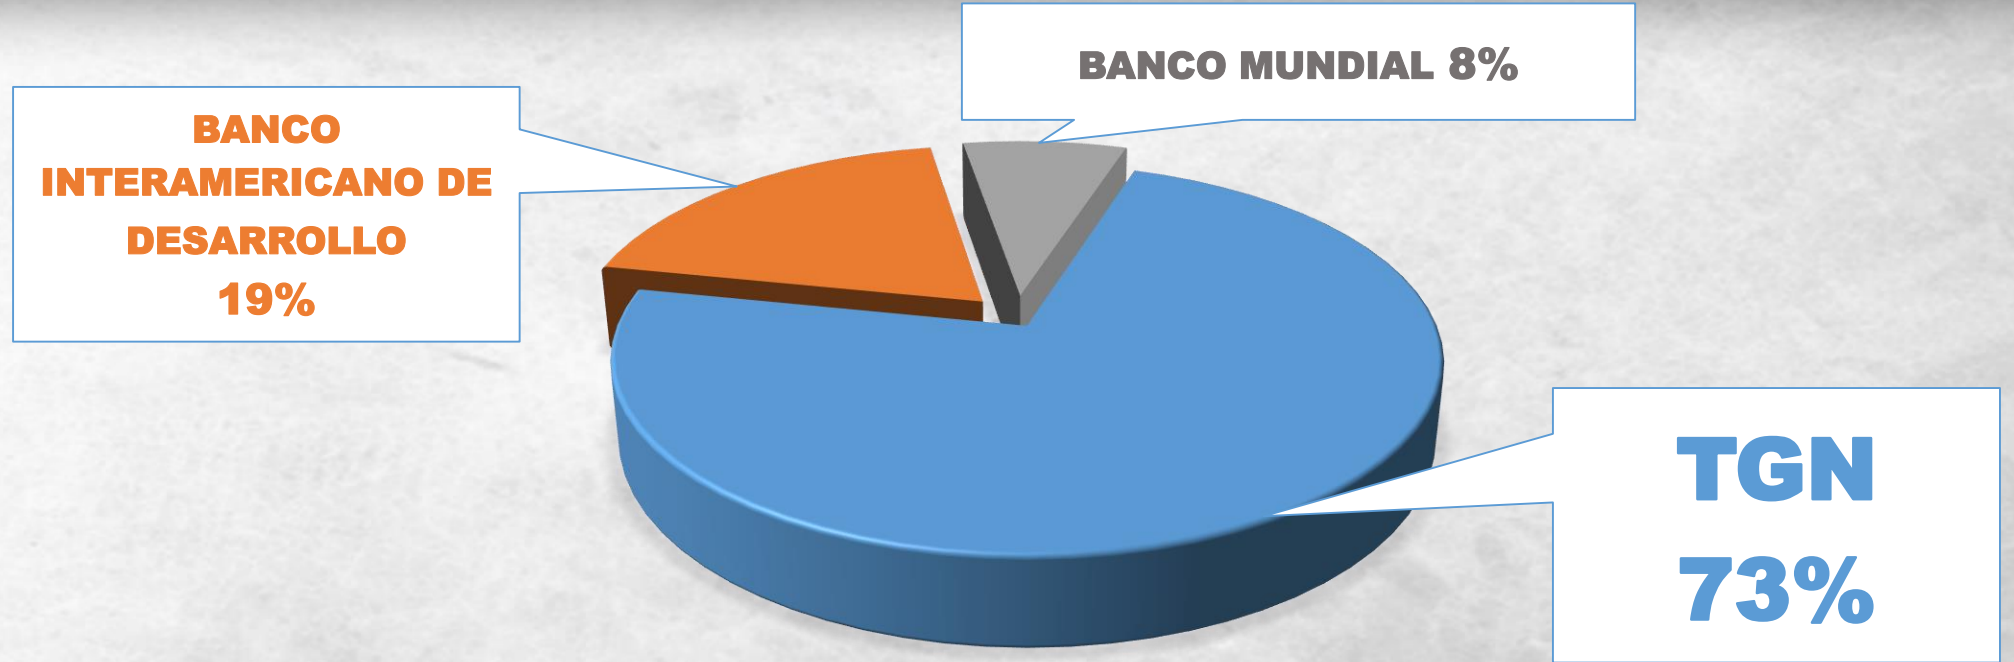

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ DESCRIPCIÓN	TESORO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	BANCO MUNDIAL	TOTAL
PRESUPUESTO	975.619.074,00	255.493.397,00	101.958.443,00	1.333.070.914,00

Un Mil Trescientos Treinta y Tres Millones Setenta Mil Novecientos Catorce 00/100 bolivianos



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - GESTIÓN 2022

PROPUESTA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

Como entidad especializada en infraestructuras hospitalarias vamos a diseñar y formalizar un **“PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO LA FORMA DE CONTRATACIÓN LLAVE EN MANO”**, para seguir siendo referente a nivel nacional en proyectos de salud.

Gobiernos autónomos departamentales y municipales, **podrán adecuar sus procedimientos** a los establecidos en el proyecto normativo de referencia y de esa forma llevar adelante la construcción de infraestructuras bajo la modalidad de llave en mano.

Ante la inexistencia de una norma que regule la caracterización de hospitales de tercer y cuarto nivel, la AISEM **propondrá** al Ministerio de Salud y Deportes, un **“PROYECTO DE NORMATIVA NACIONAL DE CARACTERIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER Y CUARTO NIVEL”** para su funcionamiento. Así como la **“ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA NACIONAL DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA, DE TAL FORMA QUE SE ADECUE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE TERCER Y CUARTO NIVEL”**.

CASO RESPIRADORES ESPAÑOLES (SOBRE PRECIO EN LA ADQUISICIÓN DE 170 RESPIRADORES ESPAÑOLES)

INSTANCIA ADMINISTRATIVA - Situación Gestión 2022

Siendo que en la gestión 2021 se efectuó la notificación con la liquidación de saldos a la Empresa IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L., a la fecha se realiza las gestiones necesarias para que la Unidad de Auditoría Interna de la AISEM, proceda a efectuar la **Auditoría Especial y de esa forma aperturar una vía expedita para la recuperación de los recursos económicos, mismos que ascienden a \$us 3.105.929,00 (Tres millones ciento cinco mil novecientos veintinueve 00/100 dólares americanos), monto que comprende el adelanto del 50% y las multas ante el incumplimiento del contrato administrativo.**

CASO RESPIRADORES ESPAÑOLES (SOBRE PRECIO EN LA ADQUISICIÓN DE 170 RESPIRADORES ESPAÑOLES)

INSTANCIA JUDICIAL - Situación Gestión 2022

El 25 de febrero del año en curso el Ministerio Público emitió la **Imputación Formal en contra de Ignacio Mazarraza Escoriza, representante legal de la Empresa Española IME CONSULTING GLOBAL SERVICES S.L., por el delito de incumplimiento de contrato, el cual se encuentra radicando en el país de España.**

A la fecha el proceso penal cuenta con una **Acusación Formal en contra de los principales responsables de la adquisición irregular de los 170 respiradores españoles, a la espera del inicio del juicio oral.**

Una vez radicado el proceso penal en el Tribunal de Sentencia en lo Penal, la AISEM procederá a presentar la **Acusación Particular en nuestra calidad de entidad víctima.**

CASO TRANSPORTE DE RESPIRADORES ESPAÑOLES (CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE LOS 170 RESPIRADORES)

Durante el gobierno de facto, adicional a la adquisición irregular de 170 respiradores, a través de otro proceso de contratación se cubrió los gastos de su transporte de los mismos, cuando los mismos debieron ser cancelados por la empresa española IME CONSULTING (empresa proveedora de los 170 respiradores).

Durante la gestión 2021 se formalizó la denuncia penal por el delito de **malversación e incumplimiento de deberes en contra de Giovanni Pacheco Fiorilo (Ex Director Ejecutivo AISEM) y el señor Carlos Scott Moreno (Ex Gerente de BOA), responsables de la prestación del servicio-vuelo chárter. Producto del mencionado proceso el Ministerio Público emitió la **Imputación Formal** en contra de los denunciados, a la espera de la realización de la audiencia de medidas cautelares.**



UNIDAD DE AUDITORÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022


ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TIPO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD	2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AISEM AL 31/12/21 ❖ PARTIDAS DE GASTO: 259, 424, 434 DE LA AISEM AL 30/06/22
AUDITORÍA OPERATIVA	1	❖ ÁREA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE LA AISEM GESTIÓN 2021
AUDITORÍA ESPECIAL	2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO A LA CEASS ❖ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO AISEM/CON/PROY/CD/LLM/CS/TGN/N°001/2017
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	9	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PRIMER SEGUIMIENTO INFORME AISEM/UAI/INF N°03/2021 ❖ SEGUNDO SEGUIMIENTO INFORME AISEM-UAI-INF N°03/2020 ❖ PRIMER SEGUIMIENTO INFORME AISEM/UAI/INF N°04/2021 ❖ SEGUNDO SEGUIMIENTO INFORME AISEM-UAI-INF N° 006/2020 ❖ SEGUNDO SEGUIMIENTO INFORME AISEM/UAI/INF N°006/2019 ❖ PRIMER SEGUIMIENTO INFORME AISEM/UAI/INF N°09/2019 ❖ PRIMER SEGUIMIENTO INFORME AISEM/UAI/INF N°08/2019 ❖ PRIMER SEGUIMIENTO INFORME AISEM/UAI/INF N°10/2019 ❖ PRIMER SEGUIMIENTO INFORME AISEM/UAI/INF N°11/2019
OTROS INFORMES	2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ VERIFICACIÓN PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES GESTIÓN 2021 ❖ REVISIÓN ANUAL DE LA DJBR GESTIÓN 2021
AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS	3	<p>A REQUERIMIENTO DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA AISEM ❖ MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES ❖ CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO**

**PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
HOSPITALARIO GESTIÓN 2022
CLASIFICADOS POR MACRO REGIONES**

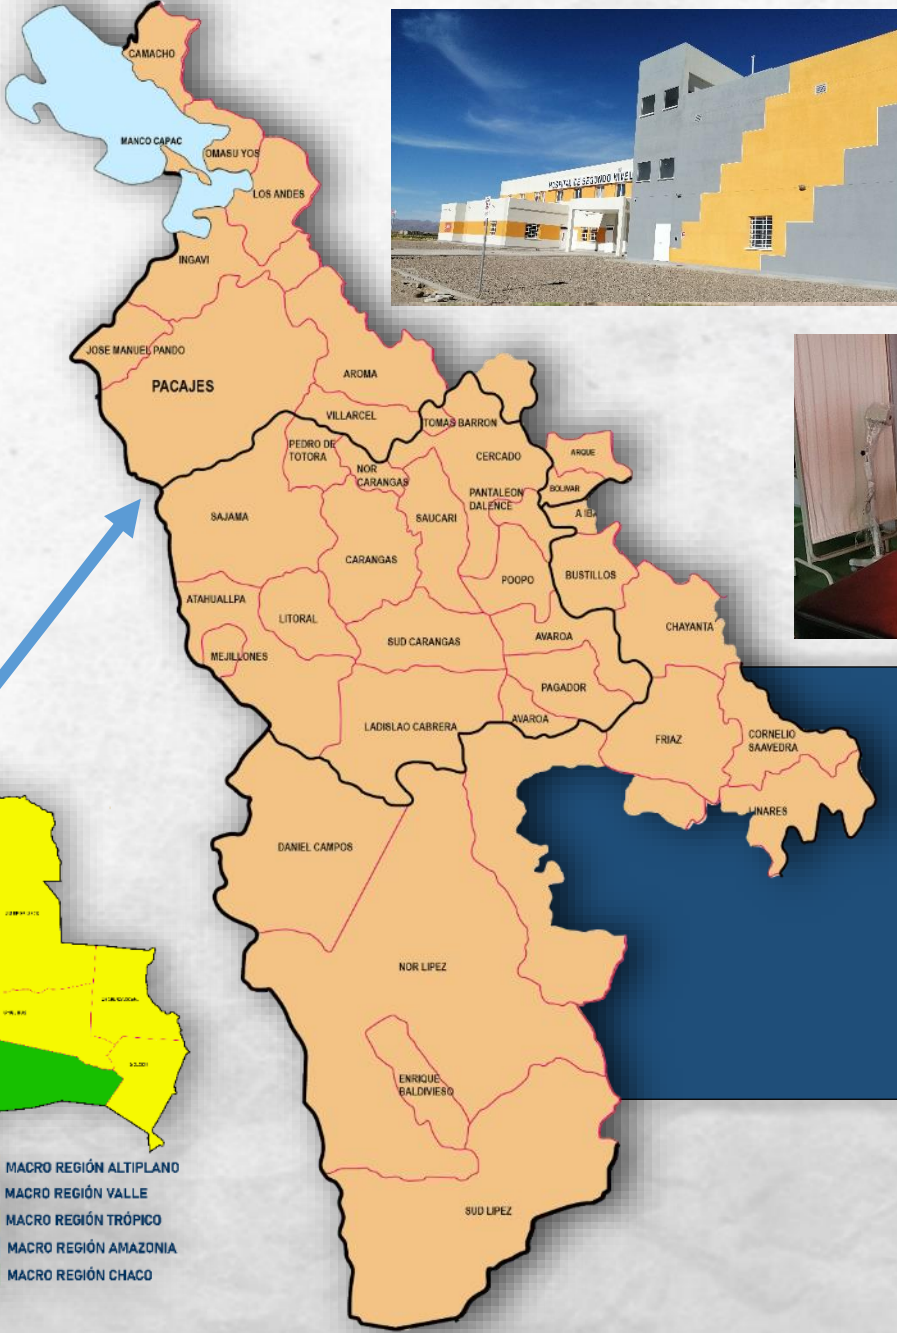

MACRO REGIÓN ALTIPLANO

- MACRO REGIÓN ALTIPLANO
- MACRO REGIÓN VALLE
- MACRO REGIÓN TRÓPICO
- MACRO REGIÓN AMAZONIA
- MACRO REGIÓN CHACO

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CHALLAPATA – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS100.600.821

POBLACIÓN BENEFICIADA:
75.292 habitantes

FASE DE PUESTA EN MARCHA:
INICIO: 27/12/2017 **FIN:** 15/02/2021



EJECUCIÓN FÍSICA = 100%
**EJECUCIÓN FINANCIERA
ACUMULADA (30/04/22)**
= 96,65%
**META DE EJECUCIÓN
FINANCIERA PROYECTADA
(AL 31/12/22) = 98,06 %**

MACRO REGIÓN ALTIPLANO

CONST. EQUIP. UNIDAD DE EMERGENCIAS HOSPITAL DE CLÍNICAS UNIVERSITARIO – LA PAZ - FUENTE BANCO MUNDIAL

COSTO DE PROYECTO:
BS63.300.000,00

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA
DEPARTAMENTAL**

INICIO: 23/11/2021

FIN: 28/02/2025



ETAPA I: BLOQUE DE CONTINGENCIAS
EJECUCIÓN FÍSICA (AL 30/04/22) = 35,88%
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA (AL 30/04/22)
= 55,13 %
META ANUAL EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PROYECTADA (AL 31/12/22) = 97,50%

ETAPA II: UNIDAD DE EMERGENCIAS
EN EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA
ELABORACIÓN DEL DISEÑO

CONST. HOSPITAL DE TERCER NIVEL MATERNO INFANTIL PEDIÁTRICO DE EL ALTO – FUENTE BID

COSTO DE PROYECTO:
BS473.340.000,00

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA
NACIONAL**

INICIO: 01/07/2021

FIN: 30/06/2025



Se inició el proceso de contratación del diseño, supervisión y puesta en marcha del hospital:

- ✓ **Se culminó con la evaluación técnica.**
- ✓ **Se evaluaron las ofertas financieras.**


MACRO REGIÓN ALTIPLANO

DISEÑO, CONST. Y EQUIP. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL TUPIZA – POTOSÍ - FUENTE BID

COSTO DE PROYECTO:
BS121.100.217,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: RED DE SALUD DE TUPIZA –
68.337 Hab.

DISEÑO: INICIO: 10/03/2022 - FIN: 10/01/2023

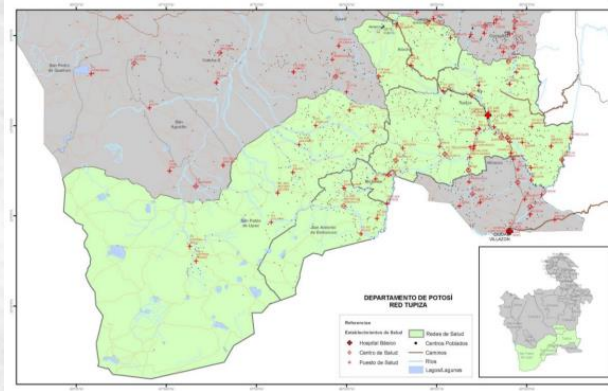

CONSTR. & EQUIP.: INICIO: 11/03/2022 - FIN: 11/05/2025


FASE I: DISEÑO
EJECUCIÓN FÍSICA (AL 30/04/22) = 5,00%
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA (AL 30/04/22)
= 10,00 %
META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA
DISEÑO (AL 31/12/22) = 95,76%

DISEÑO, CONST. Y EQUIP. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL VILLAZÓN – POTOSÍ - FUENTE BID

COSTO DE PROYECTO:
BS116.669.382,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: RED DE SALUD DE VILLAZÓN –
48.943 Hab.

DISEÑO: INICIO: 10/03/2022 - FIN: 10/01/2023

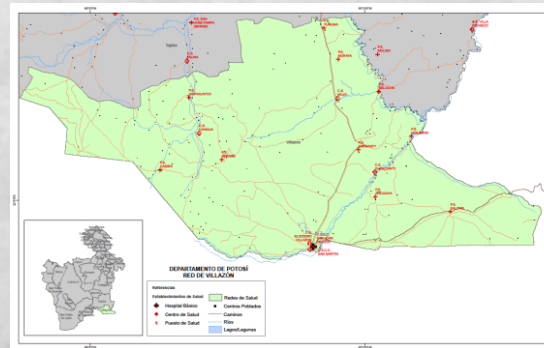

CONSTR. & EQUIP.: INICIO: 11/03/2022 - FIN: 11/05/2025

FASE I: DISEÑO
EJECUCIÓN FÍSICA (AL 30/04/22) = 5,00%
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA (AL 30/04/22)
= 10,00 %
META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA
DISEÑO (AL 31/12/22) = 95,76%

MACRO REGIÓN ALTIPLANO

CONST. CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ – FUENTE TGN Y G.A.D. POTOSÍ

COSTO DE PROYECTO
BS96.450.000,00


**POBLACIÓN BENEFICIADA DE
REFERENCIA DEPARTAMENTAL**

EJECUCIÓN FINANCIERA (ANTICIPO)
= 18,31 %

**INICIO: EN GESTIONES PARA DEFINICIÓN
DE TERRENO**

Se tiene firmado los contratos administrativos con las empresas:

- ✓ **Contratista**
- ✓ **Supervisión**

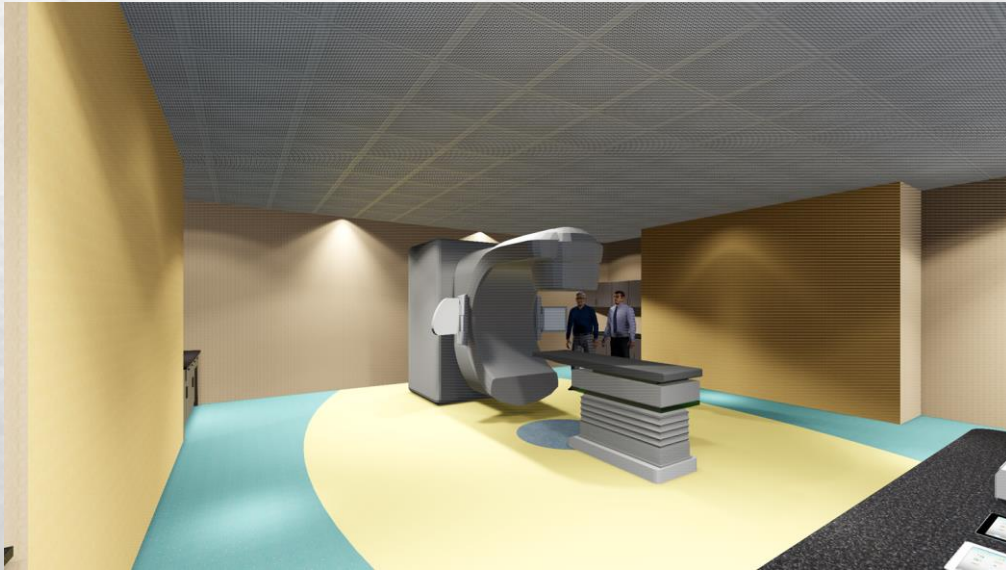

INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO DE CUARTO NIVEL DE LA PAZ – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS736.835.000

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE
REFERENCIA NACIONAL**

INICIO: 06/09/2018 **FIN:** 02/01/2024



**EJECUCIÓN FÍSICA (AL
30/04/22) = 37,09%**

**EJECUCIÓN FINANCIERA
ACUMULADA (AL 30/04/22)
= 51,45 %**

**META EJECUCIÓN FÍSICA-
FINANCIERA PROYECTADA
(AL 31/12/22) = 80,0%**

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO

FORTALECIMIENTO HOSP. CON EQUIP. MÉDICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL S.U.S. A NIVEL NACIONAL

COSTO DE PROYECTO:
BS66,911,000.00

POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA NACIONAL: 11.673.029 habitantes

INICIO: 10/02/2019 **FIN:** 31/12/2022



EJECUCIÓN FÍSICA (AL 30/04/22) = 77.59%

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA (AL 30/04/22) = 77.59%

META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA (AL 31/12/22) = 100 %

EQUIP. DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA DE LLALLAGUA Y SAN SALVADOR OCURI DEPTO.POTOSI

COSTO DE PROYECTO LLALLAGUA:
BS49,370,234.00

POBLACIÓN BENEFICIADA LLALLAGUA:
40.865 habitantes

INICIO: 03/05/2019 **FIN:** 30/06/2023

COSTO DE PROYECTO OCURI:
BS24,097,952.00

POBLACIÓN BENEFICIADA OCURI:
16.448 habitantes

EJECUCIÓN FÍSICA LLALLAGUA (AL 30/04/22) = 50%

EJECUCIÓN FÍSICA OCURI (AL 30/04/22) = 50%

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA LLALLAGUA (AL 30/04/22) = 51.25%

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA OCURI (AL 30/04/22) = 43.11%

META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA (AL 31/12/22) = 80 %

META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA (AL 31/12/22) = 80 %



PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR LA PAZ, EL ALTO NORTE LA PAZ

COSTO DE PROYECTO EL ALTO SUR: BS44,877,219.00

COSTO DE PROYECTO EL ALTO NORTE: BS9,991,139.00

POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA NACIONAL: 2.926.996 habitantes

INICIO: 18/09/2019 **FIN:** 31/12/2022



EJECUCIÓN FÍSICA EL ALTO SUR (AL 30/04/22)

= 45%

EJECUCIÓN FÍSICA EL ALTO NORTE (AL 30/04/22)

= 15%

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA EL ALTO SUR (AL 30/04/22) = 39,09 %

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA EL ALTO NORTE (AL 30/04/22) = 13,51 %

META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA (AL 31/12/22) EL ALTO SUR

= 100 %

META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA (AL 31/12/22) EL AL TO NORTE = 100 %

EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL POTOSÍ

COSTO DE PROYECTO: BS213,787,784.00

POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA NACIONAL: 902.000,00 Habitantes

INICIO: 18-09-2019 **FIN:** 31/06/2023



EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA (AL 30/04/22) = 5,39 %

META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA PROYECTADA (AL 31/12/22) = 60 %

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR LA PAZ, EL ALTO NORTE LA PAZ



INVERSIÓN HOSPITAL EL ALTO SUR	BS42.322.893,48 (SISIN)
INVERSIÓN HOSPITAL EL ALTO NORTE	BS9.991.137,24 - (SISIN)
INICIO: 03/05/2019	FIN: 31/12/2022
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021 EL ALTO SUR:	40 %
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2021 EL ALTO NORTE:	10 %
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2.926.996 Hab.



EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TERCER NIVEL POTOSÍ

INVERSIÓN:	BS213.787.784,01 - (SISIN)
INICIO: 03/05/2019	FIN: 31/12/2022
POBLACIÓN BENEFICIADA:	901.555 Hab.



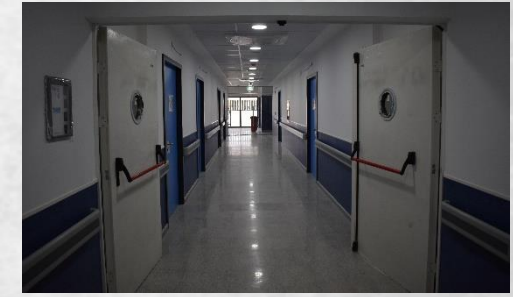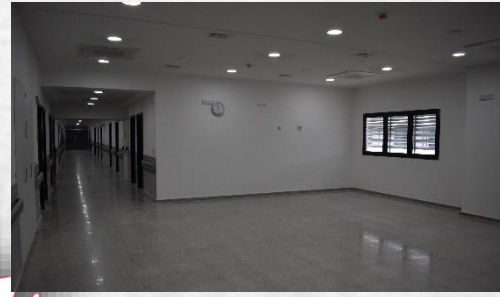

MACRO REGIÓN VALLE

- MACRO REGIÓN ALTIPLANO
- MACRO REGIÓN VALLE
- MACRO REGIÓN TRÓPICO
- MACRO REGIÓN AMAZONIA
- MACRO REGIÓN CHACO

MACRO REGIÓN VALLE

HOSPITAL DE TERCER NIVEL CHUQUISACA – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS494.385.500

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA
DEPARTEMENTAL**

INICIO: 25/07/2017

FIN: 17/05/2023

**EJECUCIÓN FÍSICA (AL
30/04/22) = 80 %**
**EJECUCIÓN FINANCIERA
ACUMULADA (AL 30/04/22)
= 84 %**
**META EJECUCIÓN FISICA-
FINANCIERA PROYECTADA
(AL 31/12/22) = 100 %**



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL CORIPATA – LA PAZ – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS95.550.000,00

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA
INTERPROVINCIAL**

INICIO:
25/05/2019

**RESOLUCIÓN CONTRATO
CONSTRUCCIÓN 19/08/2021.**

**Gestión de recursos para
reiniciar proceso expresiones
de interés.**



MACRO REGIÓN VALLE

UNIDAD DE RADIOTERAPIA COCHABAMBA – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS90.546.000



POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL



INICIO: EN GESTIONES PARA DEFINICIÓN DE TERRENO

EJECUCIÓN FÍSICA (AL 31/12/21) = 0 %
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA (AL 30/04/22) = 18,7 %

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL **QUILLACOLLO**- FUENTE TGN

COSTO REFERENCIAL DE PROYECTO: BS3.305.000,00



POBLACIÓN BENEFICIADA REFERENCIAL:
406.785 Hab.



MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA
MÉTODO DE SELECCIÓN: CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA: 240 días calendario

CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA DISEÑO:

Publicación del DBC en el SICOES	1/4/2022
Presentación y apertura de Propuestas	25/4/2022
Adjudicación o declaratoria Desierta	4/5/2022
Notificación de la Adjudicación	6/5/2022
Suscripción de Contrato	31/5/2022

INSTITUTO ONCOLÓGICO DE CUARTO NIVEL TOLATA – REACTIVACIÓN PROYECTO – FUENTE TGN

UBICACIÓN:

Zona de Villa Lourdes de Tolata, municipio de Tolata, tercera sección de la provincia Germán Jordán del Departamento de Cochabamba, que cuenta con una extensión superficial de: 55.734,87 m².

PROCESO JUDICIAL EN CURSO:

Iniciado por el contratista ELEVOLUTION en la gestión 2018.


Garantías ejecutadas en la gestión 2018.

Autos supremos vigentes no impiden reinicio de procesos de contratación de construcción y supervisión.


Estado actual:

En proceso de contratación de consultoría para Actualización Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), toda vez que el inicial data de la gestión 2016.



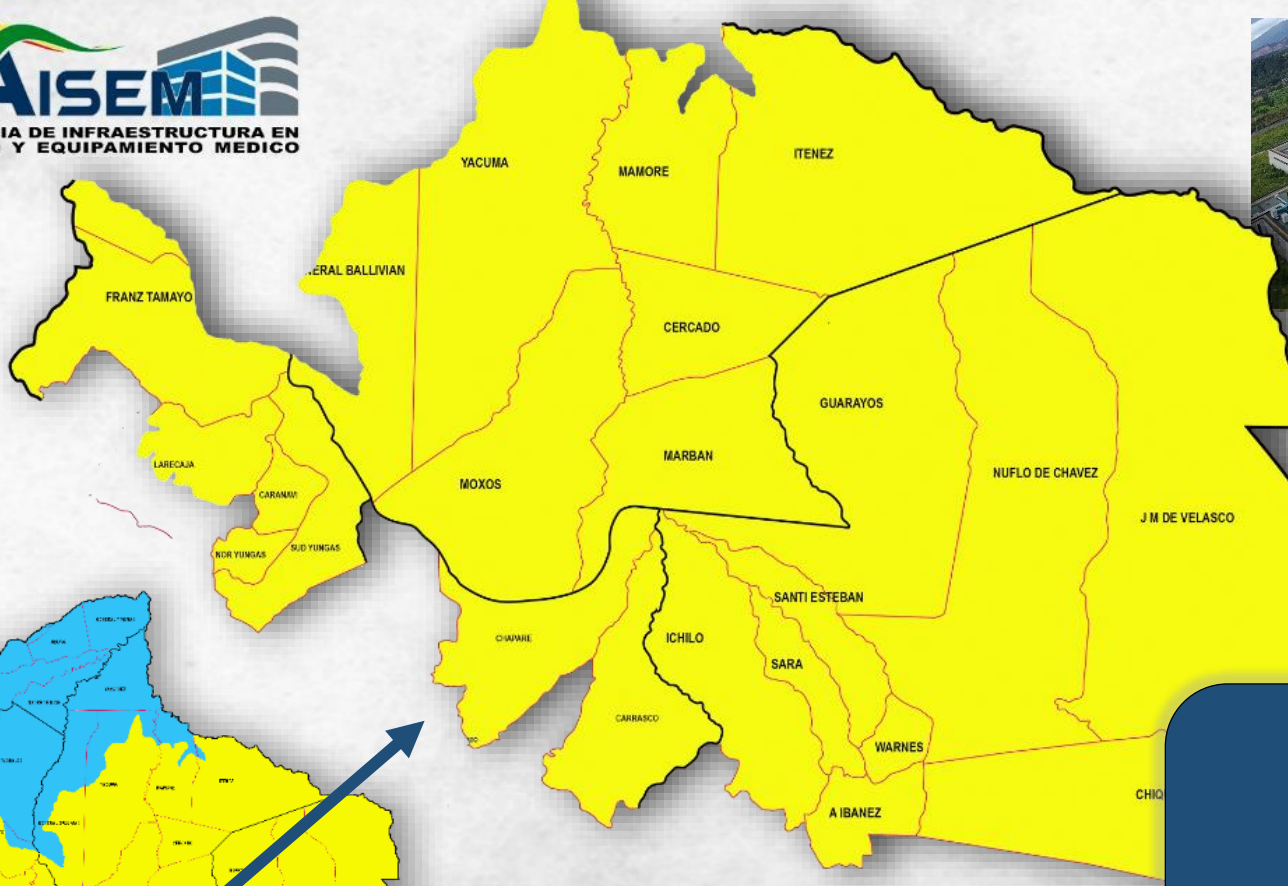

MACRO REGIÓN TRÓPICO

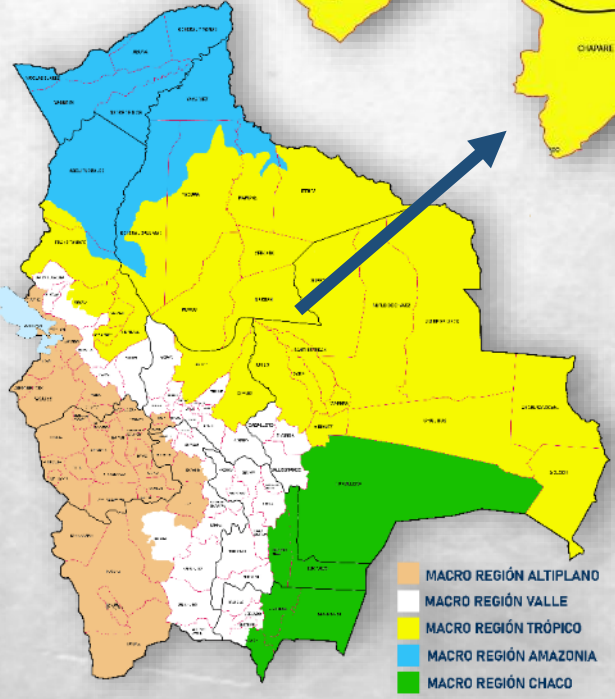

MACRO REGIÓN TRÓPICO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS535.078.000

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA INTER
DEPARTAMENTAL**

INICIO: 20/11/2017

FIN: 10/12/2022



**EJECUCIÓN FÍSICA AL
(30/04/22) = 98,48 %**
**EJECUCIÓN FINANCIERA
ACUMULADA (AL 30/04 /22)
= 98,48 %**
**META EJECUCION FÍSICA-
FINACIERA PROYECTADA
(AL 31/12/22) = 100,00 %**

HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS497.044.112

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE
REFERENCIA DEPARTAMENTAL**

**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA:**

INICIO: 28/11/2017

FIN: 21/12/2022



EJECUCIÓN FÍSICA = 100 %
**EJECUCIÓN FINANCIERA
ACUMULADA (AL 30/04/22)=
87,54%**

**EQUIPO DIRECTIVO
CONFORMADO 17 RECURSO
BATA BLANCA (MSYD)
14 RECURSO BATA GRISS
(GADSC)**

MACRO REGIÓN TRÓPICO

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL **PUERTO VILLARROEL** - FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS3.305.000,00

POBLACIÓN BENEFICIADA: PUERTO VILLARROEL (IVIRGARZAMA)– 50.000 Hab.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA:
240 días calendario

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Modalidad: LICITACIÓN PÚBLICA
Método de selección: CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
Cronograma de plazos:
Publicación del DBC en el SICOES: 31/03/2022
Presentación y apertura de propuestas: 20/04/2022
Adjudicación o declaratoria desierta: 03/05/2022
Notificación de la adjudicación: 05/05/2022
Suscripción de contrato: 31/05/2022





MACRO REGIÓN AMAZONÍA

- MACRO REGIÓN ALTIPLANO
- MACRO REGIÓN VALLE
- MACRO REGIÓN TRÓPICO
- MACRO REGIÓN AMAZONIA
- MACRO REGIÓN CHACO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL TRINIDAD – FUENTE TGN

COSTO DE PROYECTO:
BS500.477.968

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE
REFERENCIA DEPARTAMENTAL**

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO:
INICIO: 09/09/2020
FIN: 03/03/2023



EJECUCIÓN FÍSICA (AL 30/04/22)
= 30,83%

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
(AL 30/04/22) = 44,66 %**

**META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PROYECTADA (AL 31/12/22) = 66,34%**



PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL

COSTO DE PROYECTO:
BS410,200,000.00

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA
NACIONAL:** 11.673.029 habitantes

INICIO: 10-05-2019 **FIN:** 30/06/2023



EJECUCIÓN FÍSICA (AL 30/04/22)
= 30.42 %

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
(AL 30/04/22) = 30.42 %**

**META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PROYECTADA (AL 31/12/22) = 64.55 %**

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO

COSTO DE PROYECTO:
BS69,600,000.00

**POBLACIÓN BENEFICIADA DE REFERENCIA
NACIONAL:** 163.727 habitantes


INICIO: 10-05-2021 **FIN:** 31/12/2022



EJECUCIÓN FÍSICA (AL 30/04/22)
= 73.12 %

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
(AL 30/04/22) = 73.12 %**

**META EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PROYECTADA (AL 31/12/22) = 100 %**

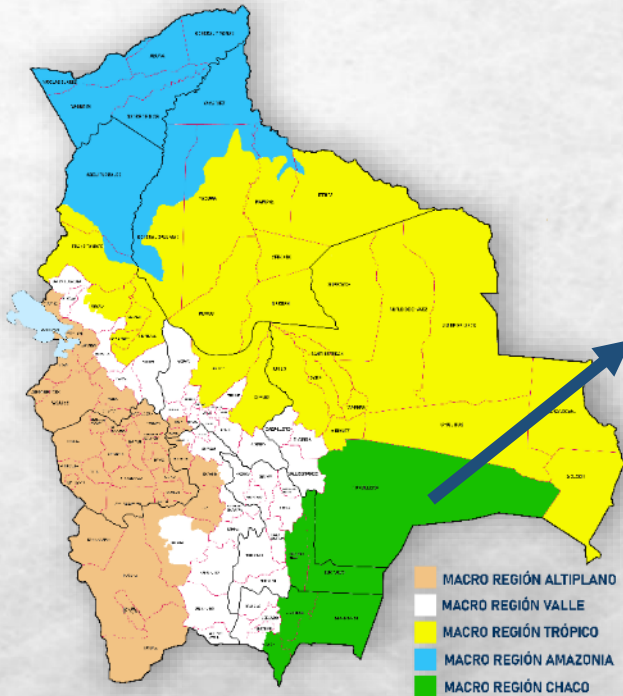

MACRO REGIÓN CHACO



AISEM ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN BOLIVIA

EQUIPAMIENTO ENTREGADO POR DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL BS.
LA PAZ	24.872.568,00
SANTA CRUZ	14.106.054,00
PANDO	3.062.914,00
BENI	5.633.911,00
ORURO	7.836.564,00
CHUQUISACA	9.318.104,00
POTOSÍ (PENDIENTE ENTREGA DEPARTAMENTAL)	3.407.444,00
TARIJA	4.988.169,00
COCHABAMBA (PENDIENTE ENTREGA DEPARTAMENTAL)	7.933.302,00
TOTAL	BS81.159.030,00



Al 31/12/2021 se contrató a 17.376 recursos humanos en salud a nivel nacional con un importe de BS421.125.257,23

FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA (COVID-19)

DEPARTAMENTO	RRHH CONTRATADOS ENERO	RRHH CONTRATADOS FEBRERO	PRESUPUESTO EN BS.
CHUQUISACA	62	62	138.200
LA PAZ	759	753	12.926.454
COCHABAMBA	124	134	2.268.904
ORURO	203	198	3.517.004
POTOSÍ	72	72	1.144.434
TARIJA	206	227	4.136.452
SANTA CRUZ	243	243	5.417.262
BENI	125	126	2.358.545
PANDO	32	32	653.220
TOTAL	1.826	1.847	32.560.475

Al 15/03/2022 se contrató a 3.673 recursos humanos en salud a nivel nacional con un importe de BS32.560.475



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
